




**Incontro di
avanzamento Infratel –
Open Fiber al 31
agosto 2020**

Materiale a supporto

1 settembre 2020

I km di infrastruttura realizzati al 31 agosto sono in linea con il piano presentato al COBUL

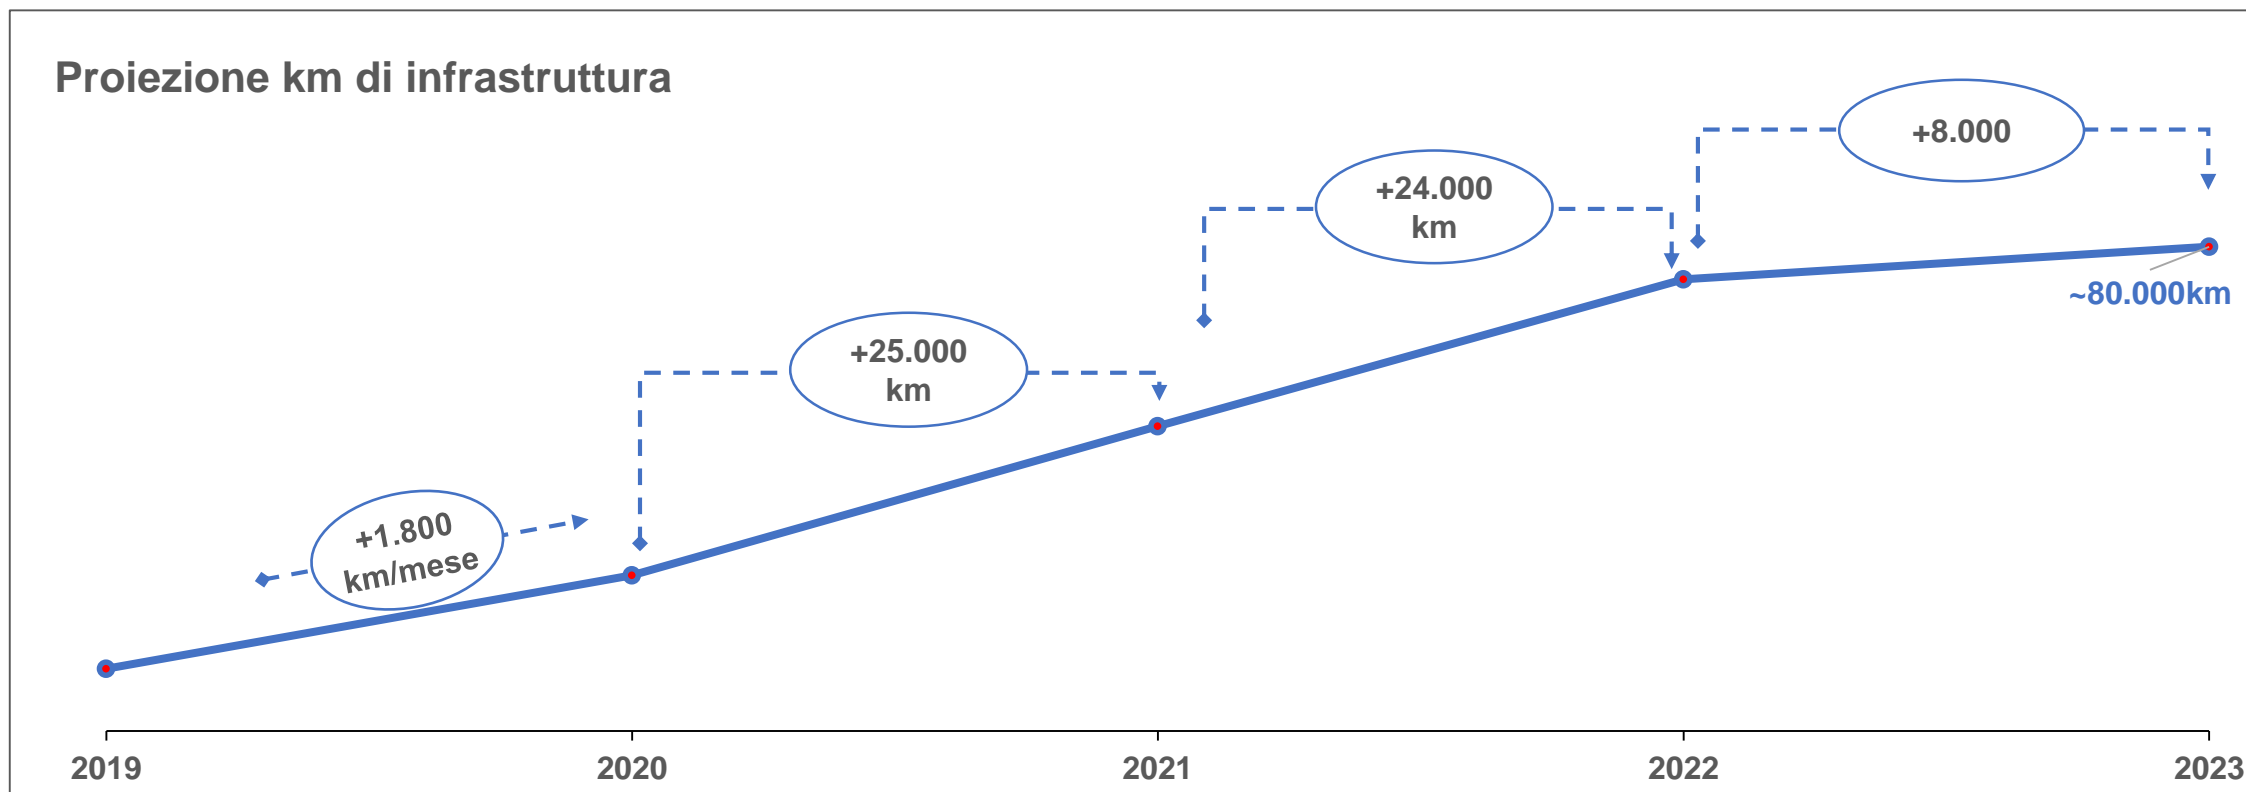


Nonostante l'impatto dell'emergenza covid, il piano di realizzazione dell'infrastruttura di Open Fiber è in linea con il piano da realizzare per la fine del 2020

La velocità di realizzazione nell'ultimo trimestre è in linea con quanto necessario per raggiungere il target di fine anno (circa **1.800 km/mese** fra settembre e dicembre)


La documentazione di «as built» di comuni FTTH al 31 agosto – funzionale ai collaudi - è in anticipo rispetto al piano di consegna

As Built Actual vs a Piano - cumulato

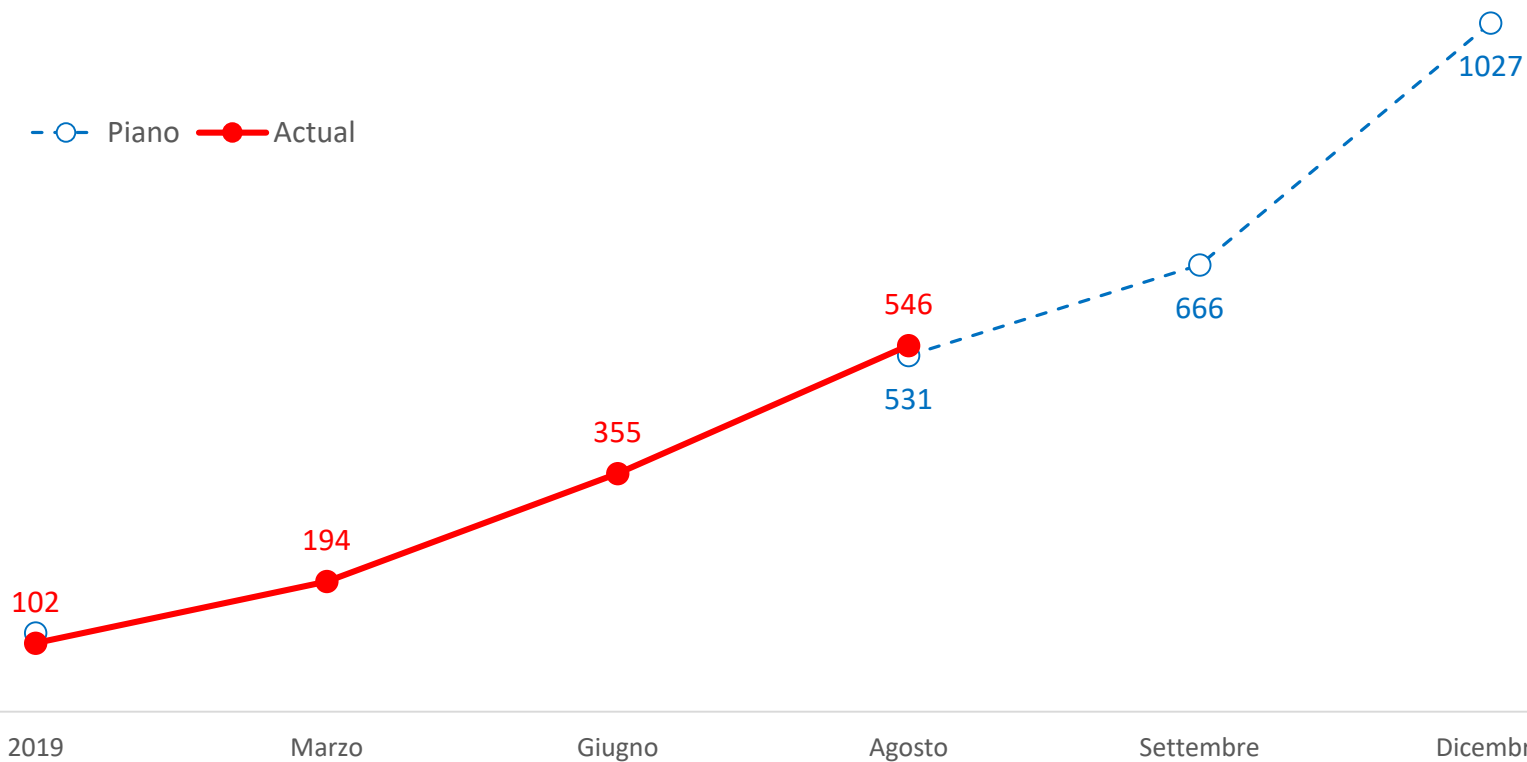

- Al 31 Agosto sono stati consegnati complessivamente mese 546 As Built E2E (+15 rispetto al piano).

Comuni in fase di collaudo

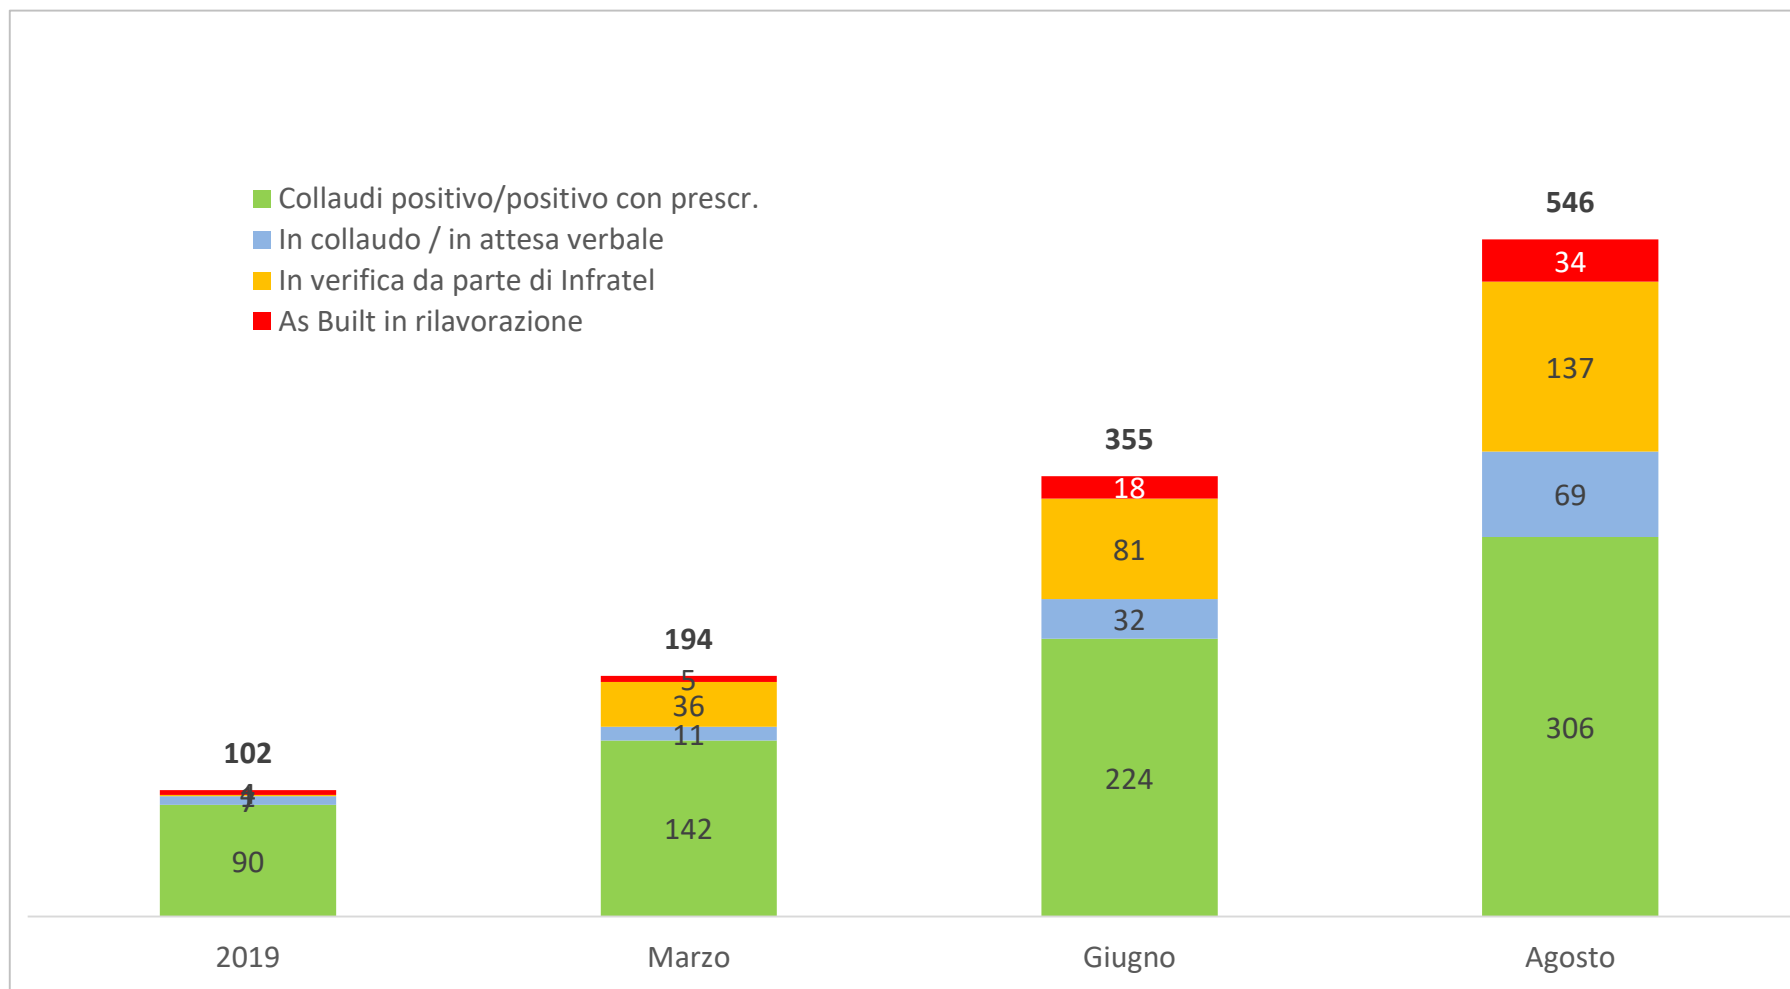

- Il grafico appresentati gli stati relativi al totale degli As Built per comuni FTTH consegnati.
- Al 31 Agosto si contano:
 - **306** collaudi positivi/ positivi con prescrizioni
 - **69** comuni in collaudo o in attesa di verbale di collaudo
 - **137** comuni in verifica da parte di Infratel
 - **34** As Built in rilavorazione

I comuni vendibili a fine agosto sono 730, con ulteriori 103 (di cui 47 in FTTH) in apertura alla vendibilità a inizio settembre

