



# **AVANZAMENTO PROGETTO BUL NELLE AREE BIANCHE**

**COMITATO BANDA ULTRALARGA - 24 GIUGNO 2020**

## STATO AVANZAMENTO PIANO PER COMUNE



### PROGETTAZIONE

**7146**  
Totale piano

**1332**  
Comuni in  
Progettazione Definitiva  
18,6% - %PD

**3066**  
Comuni in  
Progettazione Esecutiva  
42,9% - %PE

### ESECUZIONE

**293**  
Comuni esclusi  
perchè già coperti

**2076**  
Comuni aperti  
29,05% - %CA

**368**  
Comuni terminati  
5,1% - %CT

### COLLAUDO

**304**  
Comuni collaudabili  
4,3% - %CC

**265**  
di cui disponibili agli operatori  
1,5% - %CO

## CANTIERI INCARICATI



**2748**

Cantieri dichiarati aperti

**649**

Cantieri  
completati

**368**

Cantieri finiti non  
collaudabili in  
assenza di PCN

**146**

In collaudo  
entro luglio 2020

**98**

Collaudi positivi

**37**

Collaudi con prescrizioni

## COLLAUDI NEL 2020



**85**

Comuni collaudati

**84**

Collaudi  
con prescrizioni

**1**

Collaudi positivi

**1**

Collaudi negativi

## PREVISIONE OPEN FIBER COMUNI 2020-2023 (GARA 1 E 2)

REGIONE	2019	2020	2021	2022	2023
Abruzzo	46	23	58	47	0
Basilicata	27	10	57	9	0
Campania	47	44	146	212	0
Emilia Romagna	26	42	95	79	0
Friuli Venezia Giulia	39	40	37	66	9
Lazio	48	34	96	151	0
Liguria	5	10	58	72	56
Lombardia	73	65	342	355	313
Marche	13	26	133	49	0
Molise	21	9	58	44	0
Piemonte	67	90	219	385	354
Sicilia	77	60	77	104	0
Toscana	32	30	65	83	0
Trentino Alto Adige	11	20	45	138	0
Umbria	14	20	44	0	0
Valle d'Aosta	8	5	25	30	0
Veneto	60	65	137	104	87
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>614</b>	<b>693</b>	<b>1.692</b>	<b>1.928</b>	<b>810</b>

Previsione trasmessa in data 23.6.2020



## PREVISIONE OPEN FIBER COMUNI 2020-2023 (GARA 3)


REGIONE	COMUNI DA GARA	COMUNI DA PIANO	2019	2020	2021	2022
Calabria	238	238	0	22	206	238
Puglia	223	223	0	18	196	223
Sardegna	135	135	0	20	120	135

## ESITO CONTROLLO CANTIERI POST COVID

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	NESSUNA LAVORAZIONE IN CORSO - NESSUNA OPERA REALIZZATA *	ESITO VERIFICA POSITIVA NESSUNA N.C. RILEVATA CON OPERE IN CORSO	ESITO VERIFICA POSITIVA CON PRESCRIZIONI DI N.C. LIEVI CON OPERE IN CORSO	ESITO VERIFICA POSITIVA CON PRESCRIZIONI DI N.C. GRAVI CON OPERE IN CORSO	STATO AVANZAMENTO LAVORI IN %
Abruzzo	L'Aquila	Rocca di Cambio				1	30%
Campania	Salerno	Maiori				1	65%
Lazio	Roma	Valmontone	1				0%
Lazio	Latina	Santi Cosma e Damiano		1		1	20%
Lazio	Roma	Rocca di Cave				1	20%
Lazio	Rieti	Cittaducale					35%
Lazio	Roma	Mandela		1		1	60%
Lazio	Rieti	Fara in Sabina				1	70%
Lazio	Roma	Casape					70%
Lazio	Roma	Montelibretti		1		1	70%
Lazio	Frosinone	Atina		1			80%
Lazio	Rieti	Montebuono					80%
Sicilia	Catania	Sant'Alfio	1				0%
Sicilia	Siracusa	Augusta	1				0%
Sicilia	Siracusa	Noto	1				0%
Sicilia	Siracusa	Pachino	1				0%
Sicilia	Siracusa	Portopalo di Capo Passero		1			25%
Sicilia	Catania	Valverde			1		30%
Sicilia	Siracusa	Ferla				1	30%
Sicilia	Siracusa	Cassaro		1			100%
Totale			5	6	1	8	
% esito delle verifiche			25%	30%	5%	40%	

\* Mancanza di autorizzazioni, errori progettuali, attività non pianificate


## RAFFORZAMENTO FUNZIONE CONTROLLO CANTIERI INFRATEL ITALIA

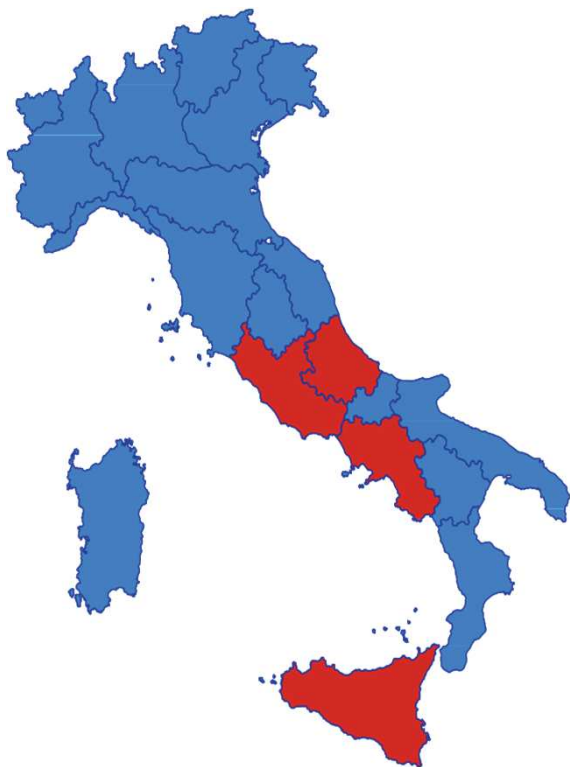

- **Procedura ristretta verificatori:** Il Consiglio di Amministrazione di Infratel Italia in data 26 maggio ha approvato la procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b) e art. 157, co. 2, del d.lgs n. 50/2016 per l'affidamento di incarico per «verifiche in corso d'opera» di impianti in fibra ottica, con l'obiettivo di selezionare professionisti qualificati per l'attività di controllo dei cantieri Open Fiber. Avviate le procedure di selezione.
- **Numero verifiche effettuate (maggio-giugno 2020): 19**



## SEMPLIFICAZIONI ACCORDATE AL CONCESSIONARIO

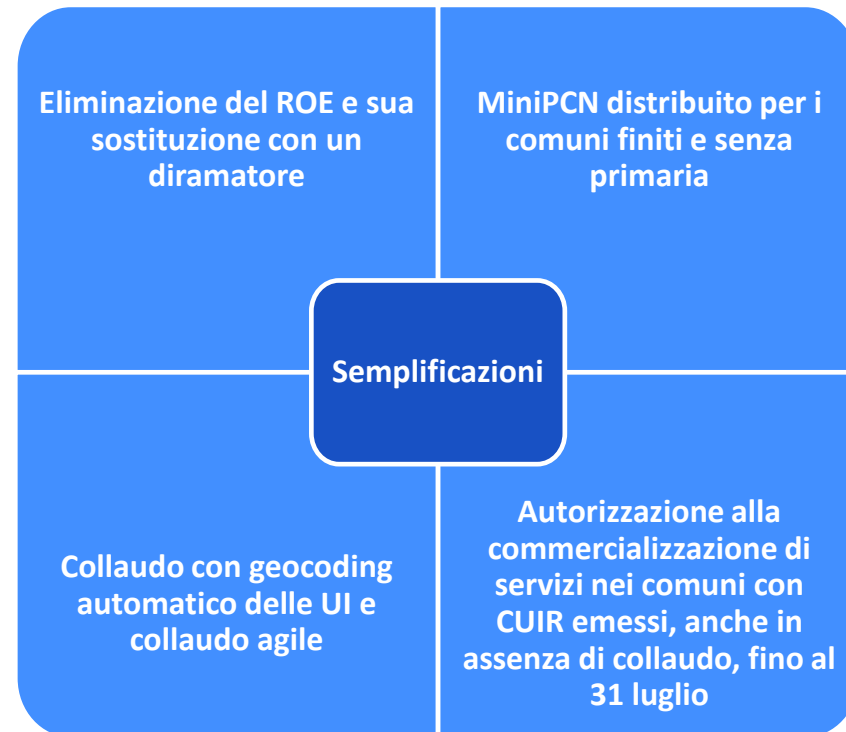

## NUOVO SITO BUL

- Interfaccia di navigazione semplice ed intuitiva, navigabile da tutti i device (mobile, tablet, PC)
- Mappa con gli indicatori di avanzamento dei cantieri suddivisi per comune
- Infografiche di sintesi sull'avanzamento del progetto concessione
- Ricerca copertura dei servizi a banda ultralarga per civico

### A breve rilascio

- Intervento diretto BUL: introduzione sulla mappa della visualizzazione dei comuni oggetto di intervento diretto pubblico BUL (669 comuni)
- Open data: miglioramento della funzionalità degli Open Data
- PCN e mini PCN: visualizzazione dei comuni sede di PCN/mini PCN e dei comuni illuminati a cascata

